2026
5月

工事のお知らせ

株式会社石井組

■工　事　名　経営体育成基盤整備事業　姫田川右岸地区　区画整理第40次工事

■工事の内容
・区画整理　6.42ha　　・整地工　6.42ha
・用水路工　663.9m　　・排水路工　1000.6m
・道路工　1267.2m

■工事の効果　ほ場整備工事を実施する事で田んぼの大区画化・用水路のパイプライン化・排水路・農道の整備によって、農作業にかかる手間や労力が低減され作業効率が向上します。

■発　注　者　新発田地域振興局　農村整備部

■受　注　者　株式会社　石井組

■工　　期　自　令和8年3月30日　～　至　令和9年1月29日

■施 工 場 所　新発田市　下楠川、南盾　地内

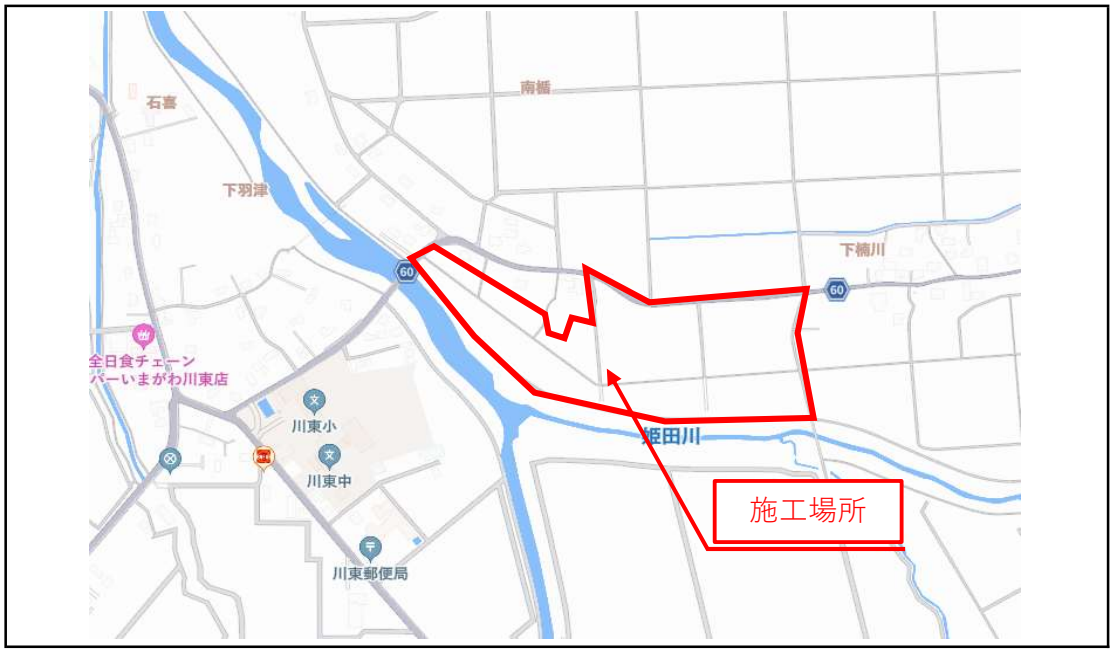

■工事予定期

工種等			8年							9年
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
準備工										
整地工										
管水路工										
開排水路工										
付帯工										
道路工										
後片付工										

■進 捗 状 況

・4月は現場の準備工作業で田んぼの土質調査や現況測量の作業を実施しました。5月は中旬頃から表土剥ぎ取り作業や旧構造物の撤去等で本格的に現場を着手する予定です。



土質調査実施	ICT起工測量





■担当者から

皆様、こんにちは。
この度、【姫田川右岸地区　区画整理第40次工事】を担当します現場代理人の野澤です。本工事は5月中旬より現場の施工が始まります。工事期間中は車両の出入り騒音・振動等で地域の皆様にはご迷惑やご不便をお掛けする場合も御座いますが、何卒ご理解、ご協力の方よろしくお願いいたします。今後は工事のお知らせとして毎月上旬頃に施工状況や現場の進捗状況を記載していきたいと思いますので皆様ご覧になってください。



株式会社　石井組
〒957-0051　新潟県新発田市城北町2丁目10番20号
TEL.0254-22-3261　　FAX.0254-22-1286
https://www.k-ishiigumi.jp/　　contact@k-ishiigumi.jp
