2026
6月

工事のお知らせ

株式会社石井組

■工　事　名　経営体育成基盤整備事業　姫田川右岸地区　区画整理第40次工事

■工事の内容
・区画整理　6.42ha　　・整地工　6.42ha
・用水路工　663.9m　　・排水路工　1000.6m
・道路工　1267.2m

■工事の効果　ほ場整備工事を実施する事で田んぼの大区画化・用水路のパイプライン化・排水路・農道の整備によって、農作業にかかる手間や労力が低減され作業効率が向上します。

■発　注　者　新発田地域振興局　農村整備部

■受　注　者　株式会社　石井組

■工　　期　自　令和8年3月30日　～　至　令和9年1月29日

■施 工 場 所　新発田市　下楠川、南盾　地内

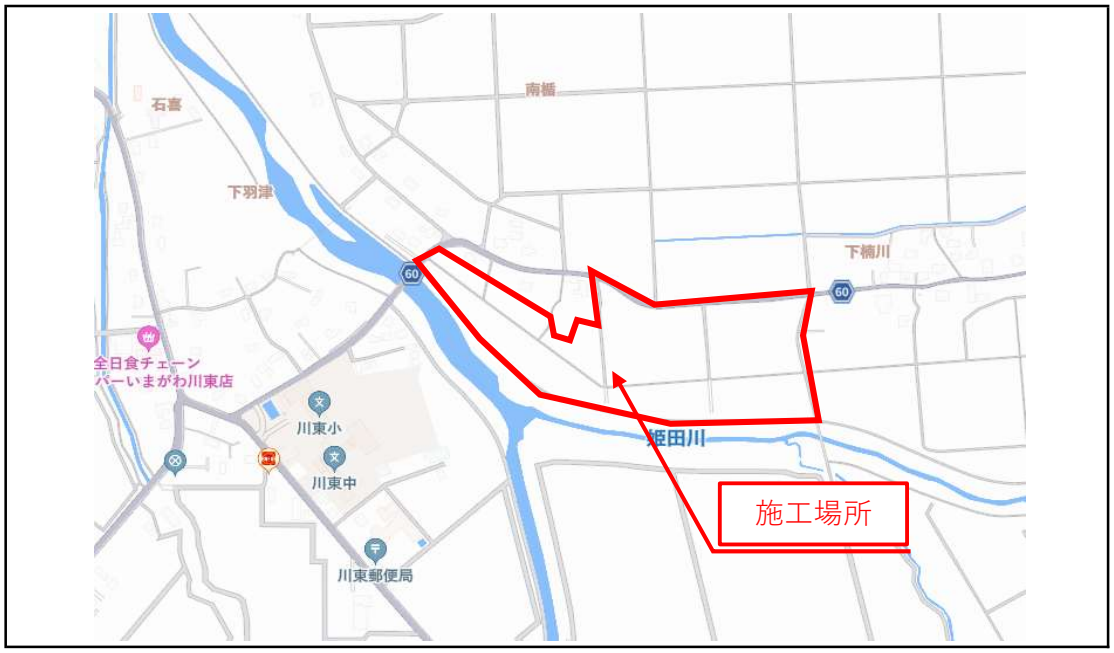

■工事予定期

工種等				8年						9年
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
準備工	―	―								
整地工		―	―	―	―	―	―			
管水路工			―	―						
開排水路工				―	―					
付帯工							―			
道路工			―	―	―	―	―	―		
後片付工								―	―	―

■進 捗 状 況

・5月中旬より本格的に現場着手となり、表土剥ぎ取り・構造物の撤去等の作業を行いました。6月は引き続き表土剥ぎ取り・構造物の撤去の他に基盤整地や管水路(用水パイプライン)の作業を予定しております。：5月末進捗率　3.5％



表土剥ぎ取り状況		旧構造物撤去状況
		

■担当者から

皆様、こんにちは。現場代理人の野澤です。
本工事は予定通り5月中旬より現場の施工が始まりました。
これからの季節は熱中症に心配がありますので現場の方でも対策用品等を配布し対策に努めていきます。
また、今回の工事ではICT(情報通信技術)を活用した整地や土工の作業を予定しています。今後実施状況等も記載していきますのでご覧ください。引き続き地域の皆様には工事期間中ご迷惑やご不便をおかけしますがご協力の方よろしくお願いいたします。



株式会社　石井組
〒957-0051　新潟県新発田市城北町2丁目10番20号
TEL.0254-22-3261　　FAX.0254-22-1286
https://www.k-ishiigumi.jp/　　contact@k-ishiigumi.jp
