2026
8月

工事のお知らせ

株式会社石井組

■工　事　名　経営体育成基盤整備事業　姫田川右岸地区　区画整理第40次工事

■工事の内容
・区画整理　6.42ha　　・整地工　6.42ha
・用水路工　663.9m　　・排水路工　1000.6m
・道路工　1267.2m

■工事の効果　ほ場整備工事を実施する事で田んぼの大区画化・用水路のパイプライン化・排水路・農道の整備によって、農作業にかかる手間や労力が低減され作業効率が向上します。

■発　注　者　新発田地域振興局　農村整備部

■受　注　者　株式会社　石井組

■工　　期　自　令和8年3月30日　～　至　令和9年1月29日

■施 工 場 所　新発田市　下楠川、南盾　地内

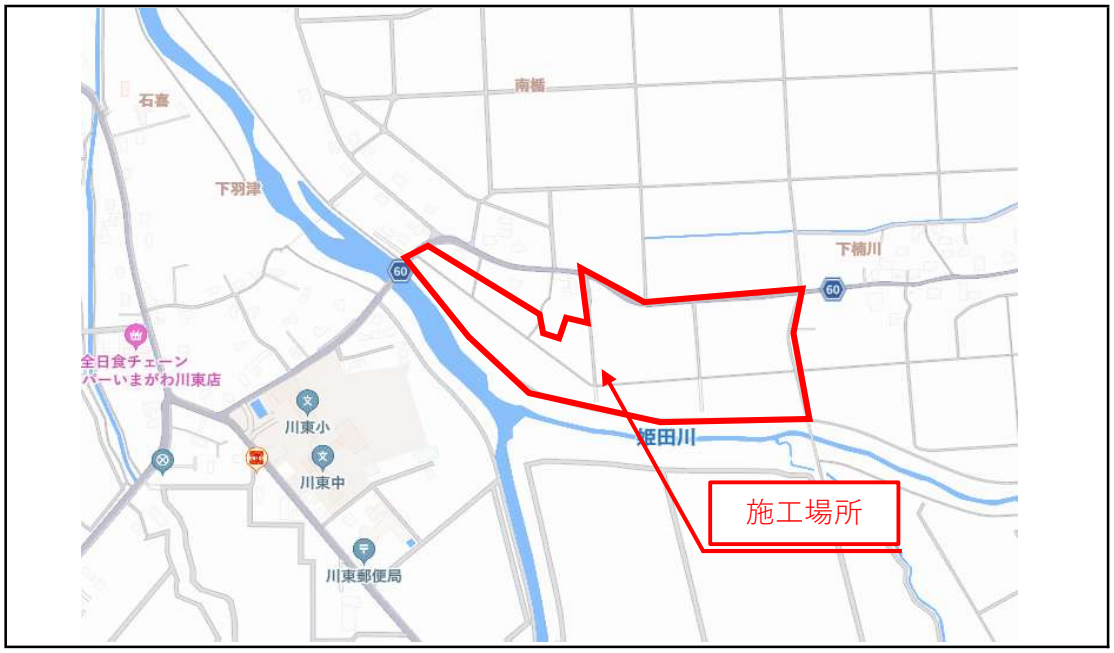

■工事予定期

工種等	8年								9年
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
準備工	■	■								
整地工		■	■	■	■	■	■			
管水路工			■	■						
開排水路工				■	■					
付帯工							■			
道路工			■	■	■	■	■	■		
後片付工								■	■	■

■進 捗 状 況

・7月は整地工(基盤整地・表土戻し)・道路工・管水路・開排水路工の作業の実施となりました。8月も引き続き整地工(本整地)・道路工・開排水路工のを作業を予定しております。：7月末進捗率　56.8%



基盤整地状況	開排水路施工状況	ICT活用施工(土工)
		

■担当者から

皆様、こんにちは。現場代理人の野澤です。
梅雨時期ともなり7月後半は天候も悪く現場を休工する日も何日かありました。開排水路工の土工作業ではICT技術を活用して掘削作業を施工しております。(杭ナビ使用)
当社の職員も今回杭ナビで現場の測量を行ってますが、使い慣れると非常に便利なものです。
引き続き地域の皆様には工事期間中ご迷惑やご不便をおかけしますがご協力の方よろしくお願いいたします。



株式会社　石井組
〒957-0051　新潟県新発田市城北町2丁目10番20号
TEL.0254-22-3261　　FAX.0254-22-1286
https://www.k-ishiigumi.jp/　　contact@k-ishiigumi.jp
